

SECRETARIA-EXECUTIVA

Novo PAC — MCid

Balanço da carteira — da seleção à execução das obras.



11SELEÇÃO

Carteira de seleções

ORIGEM

MigradasNovas

RECORTE

Brasil — todas as UFs

STATUS

SelecionadasEnquadradas

FONTE

OGUFIN

ANO

232526

3.511PROPOSTAS¹

R\$ 145,0 biVALOR TOTAL

R\$ 41,0 biOGU

R\$ 104,1 biFINANCIAMENTO

Atualizado em 16/10/2026 · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: migradas + novas · Status: selecionadas + enquadradas · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	QTD. FIN	QTD. OGU	TOTAL	VALOR OGU (R\$ MI)	VALOR FIN (R\$ MI)	VALOR TOTAL (R\$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	0	400	400	1.044,80	0,00	1.044,80
Abastecimento de Água - Urbano	257	214	471	3.826,61	11.185,71	15.012,32
Contenção de Encostas	31	240	271	3.884,51	558,71	4.443,22
Drenagem Urbana	164	323	487	10.748,62	12.202,54	22.951,17
Esgotamento Sanitário	399	253	652	5.331,03	18.040,27	23.371,30
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	86	86	172	10.165,23	30.293,76	40.458,99
Regularização Fundiária	0	309	309	507,75	0,00	507,75
Renovação de Frota	387	1	388	319,27	23.602,13	23.921,40
Resíduos Sólidos	56	105	161	761,90	458,52	1.220,42
Urbanização de Favelas	88	112	200	4.375,27	7.721,73	12.096,99
TOTAL	1.468	2.043	3.511	40.964,99	104.063,38	145.028,37

¹ 3.511 propostas = 2.954 novas seleções + 557 migradas (legado).

EXIBIRValores% do total

1.2
SELEÇÃO

Carteira do Novo PAC por Modalidade

Distribuição das seleções por fonte de recursos.

ORIGEM

Migradas

Novas

RECORTE

Brasil — todas as UFs

STATUS

Selecionadas

Enquadradas

FONTE

OGU

FIN

ANO

23

25

26

MEDIDA

Quantidade

Valor

EXIBIR

Total

%

Atualizado em 16/10/2026 · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: migradas + novas · Status: selecionadas + enquadradas · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

3.511

PROPOSTAS NA CARTEIRA¹



OGU FIN posição não utilizada
Cada quadrado completo = 10 propostas.

Esgotamento Sanitário

652

PROPOSTAS

OGU 253 38,8%

FIN 399 61,2%

Drenagem Urbana

487

PROPOSTAS

OGU 323 66,3%

FIN 164 33,7%

Abastecimento de Água - Urbano

471

PROPOSTAS

OGU 214 45,4%

FIN 257 54,6%

Abastecimento de Água - Rural

400

PROPOSTAS

OGU 400 100,0%

FIN 0 0,0%

Renovação de Frota

388

PROPOSTAS

OGU 1 0,3%

FIN 387 99,7%

Regularização Fundiária

309

PROPOSTAS

OGU 309 100,0%

FIN 0 0,0%

Contenção de Encostas

271

PROPOSTAS

OGU 240 88,6%

FIN 31 11,4%

Urbanização de Favelas

200

PROPOSTAS

OGU 112 56,0%

FIN 88 44,0%

Mobilidade: Médias e Grandes Cidades

172

PROPOSTAS

OGU 86 50,0%

FIN 86 50,0%

Resíduos Sólidos

161

PROPOSTAS

OGU 105 65,2%

FIN 56 34,8%

VALOR OGU

R\$ 40.964,99 mi

VALOR FIN

R\$ 104.063,38 mi

VALOR TOTAL

R\$ 145.028,37 mi

¹ Mesmo recorte do 1.1: 3.511 propostas (2.954 novas + 557 migradas). Quadrado = 10 propostas; o último é parcial; cinza = posição livre (70 por modalidade).

2.1
SUSPENSIVAS

Cláusulas suspensivas — OGU

RECORTE
Brasil — todas as UFs

FONTE
OGU

ANO
23 25 26

Contratos OGU = sem suspensiva + suspensiva retirada + suspensiva pendente.

1.525
CONTRATOS OGU²

1.491
COM SUSPENSIVA

1.197 · 80,3%
RETIRADAS

294
PENDENTES³

Situação em 17/10/2026 · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	SEM SUSPENSIVA	COM CLÁUSULA SUSPENSIVA			TOTAL CONTRATOS OGU ²	% RETIRADA ¹	REPASSE PENDENTE (R\$ MI)
		RETIRADAS	PENDENTES ³	SUBTOTAL			
Abastecimento de Água - Rural	8	173	130	303	311	57,1%	608,52
Abastecimento de Água - Urbano	1	175	7	182	183	96,2%	107,55
Contenção de Encostas	0	127	45	172	172	73,8%	628,16
Drenagem Urbana	0	208	59	267	267	77,9%	2.156,64
Esgotamento Sanitário	2	121	6	127	129	95,3%	43,77
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	3	61	1	62	65	98,4%	273,23
Regularização Fundiária	20	210	26	236	256	89,0%	143,99
Resíduos Sólidos	0	83	20	103	103	80,6%	182,23
Urbanização de Favelas	0	39	0	39	39	100,0%	0,00
TOTAL	34	1.197	294	1.491	1.525	80,3%	4.144,09

¹ % retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula suspensiva. ² Base: 1.525 contratos OGU do painelpac, sem cancelados e sem 1 com bln_pac = NÃO. [ver a conta passo a passo ⓘ](#) · ³ [conta da coluna Em suspensiva \(3.1\) ⓘ](#)

2.2
SUSPENSIVAS

Alinhamento das suspensivas


Datas de retirada pactuadas pela DMP (08/2026), por modalidade.

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

TAMANHO Repasse Contratos MOSTRAR Todos Só pendentes

Situação em 17/10/2026 · Contagem: contratos OGU com data alinhada pela DMP (08/2026) · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil

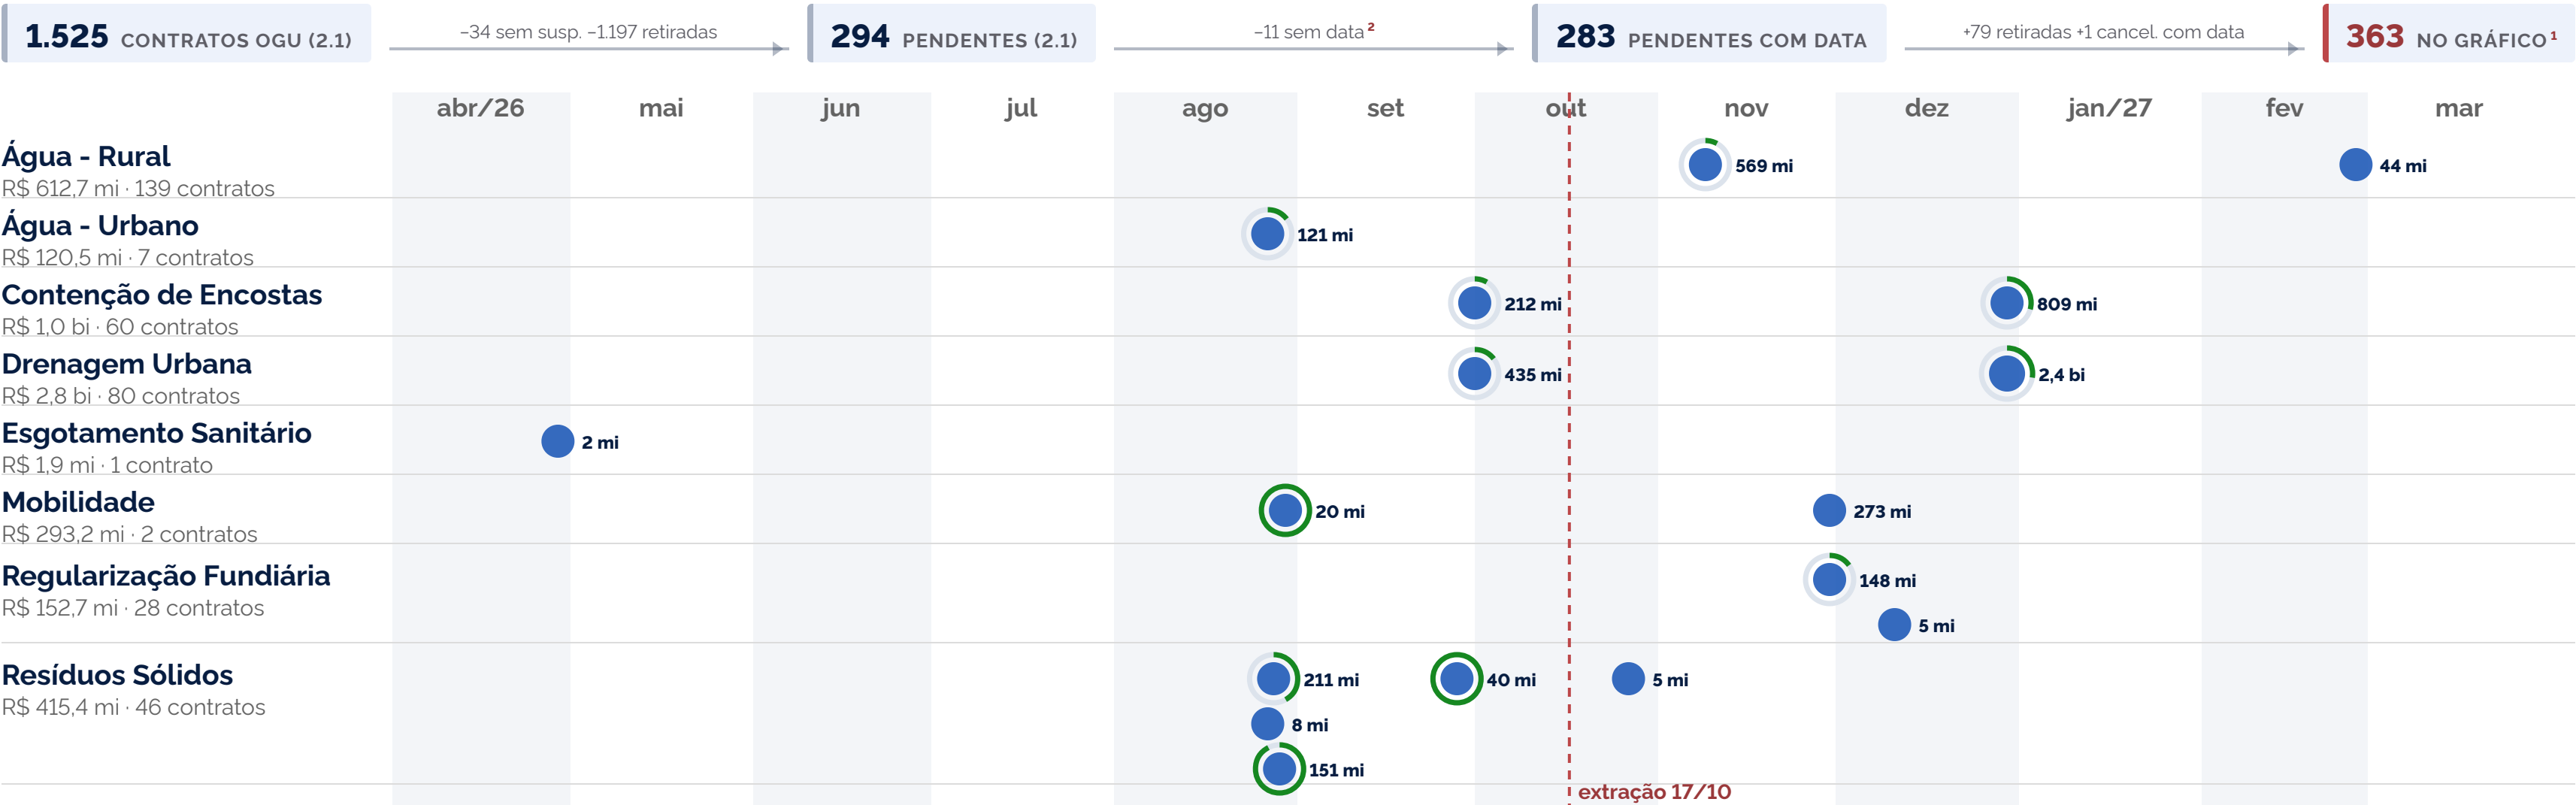

● círculo = data alinhada · área ∝ repasse · número = repasse somado (R\$) ● anel verde = fatia já retirada | data da extração

¹ 363 > 294 pendentes: às 283 pendentes com data somam-se 79 já retiradas e 1 cancelada (a data vale após a retirada); 11 pendentes ficaram fora do alinhamento. [ver a conta passo a passo](#) ⓘ

² 11 suspensivas pendentes do 2.1 ficaram fora do alinhamento de 08/2026 (sem data, não aparecem no gráfico) — R\$ 61,3 mi de repasse. [ver os contratos](#) ⓘ

3.1
LICITAÇÃO

Etapa atual dos contratos OGU

RECORTE
Brasil — todas as UFs

FONTE
OGU

ANO
232526



Situação em 17/10/2026 · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção, sem cancelados — etapa mais avançada · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	SEM REGISTRO	EM SUSPENSIVA ²	SUSPENSIVA RETIRADA/LAE ³	EDITAL PUBLICADO ⁴	LICITAÇÃO HOMOLOGADA	VRPL / AIO	OBRA INICIADA	TOTAL ¹
Abastecimento de Água - Rural	8	122	19	53	38	6	65	311
Abastecimento de Água - Urbano	0	5	10	34	51	21	62	183
Contenção de Encostas	0	40	32	19	29	24	28	172
Drenagem Urbana	0	54	39	47	40	22	65	267
Esgotamento Sanitário	2	0	10	19	32	38	28	129
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	2	1	7	19	11	3	22	65
Regularização Fundiária	1	26	14	33	31	21	130	256
Resíduos Sólidos	0	19	29	14	14	17	10	103
Urbanização de Favelas	0	0	3	1	4	13	18	39
TOTAL	13	267	163	239	250	165	428	1.525

¹ De 2.043 seleções OGU (slide 1.1) a 1.525 contratos OGU: migradas, seleções sem contrato, bln_pac = NÃO, sem modalidade e cancelados saem; contratos sem proposta ligada entram. [ver a conta passo a passo](#) ⓘ · ² [conta da coluna Em suspensiva \(3.1\)](#) ⓘ · ³ [conta até a régua \(3.2\)](#) ⓘ · ⁴ [conta do edital até o fim da licitação \(3.2\)](#) ⓘ

3.2
LICITAÇÃO

Régua do prazo: antes × agora

RECORTE
Brasil — todas as UFs

FONTE
OGU

ANO
232526

MEDIDA
QuantidadeValor


ETAPA
Publicação do editalFim da licitação

Situação em 17/10/2026 · Contagem: contratos OGU em Contratado - Normal, aguardando edital ou homologação · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil

A REGRA · ART. 36-A DA PC 32/2024 (INCLUÍDO PELA PC 48/2026)



155 contratos sem edital publicado · 1 ponto = 1 contrato¹

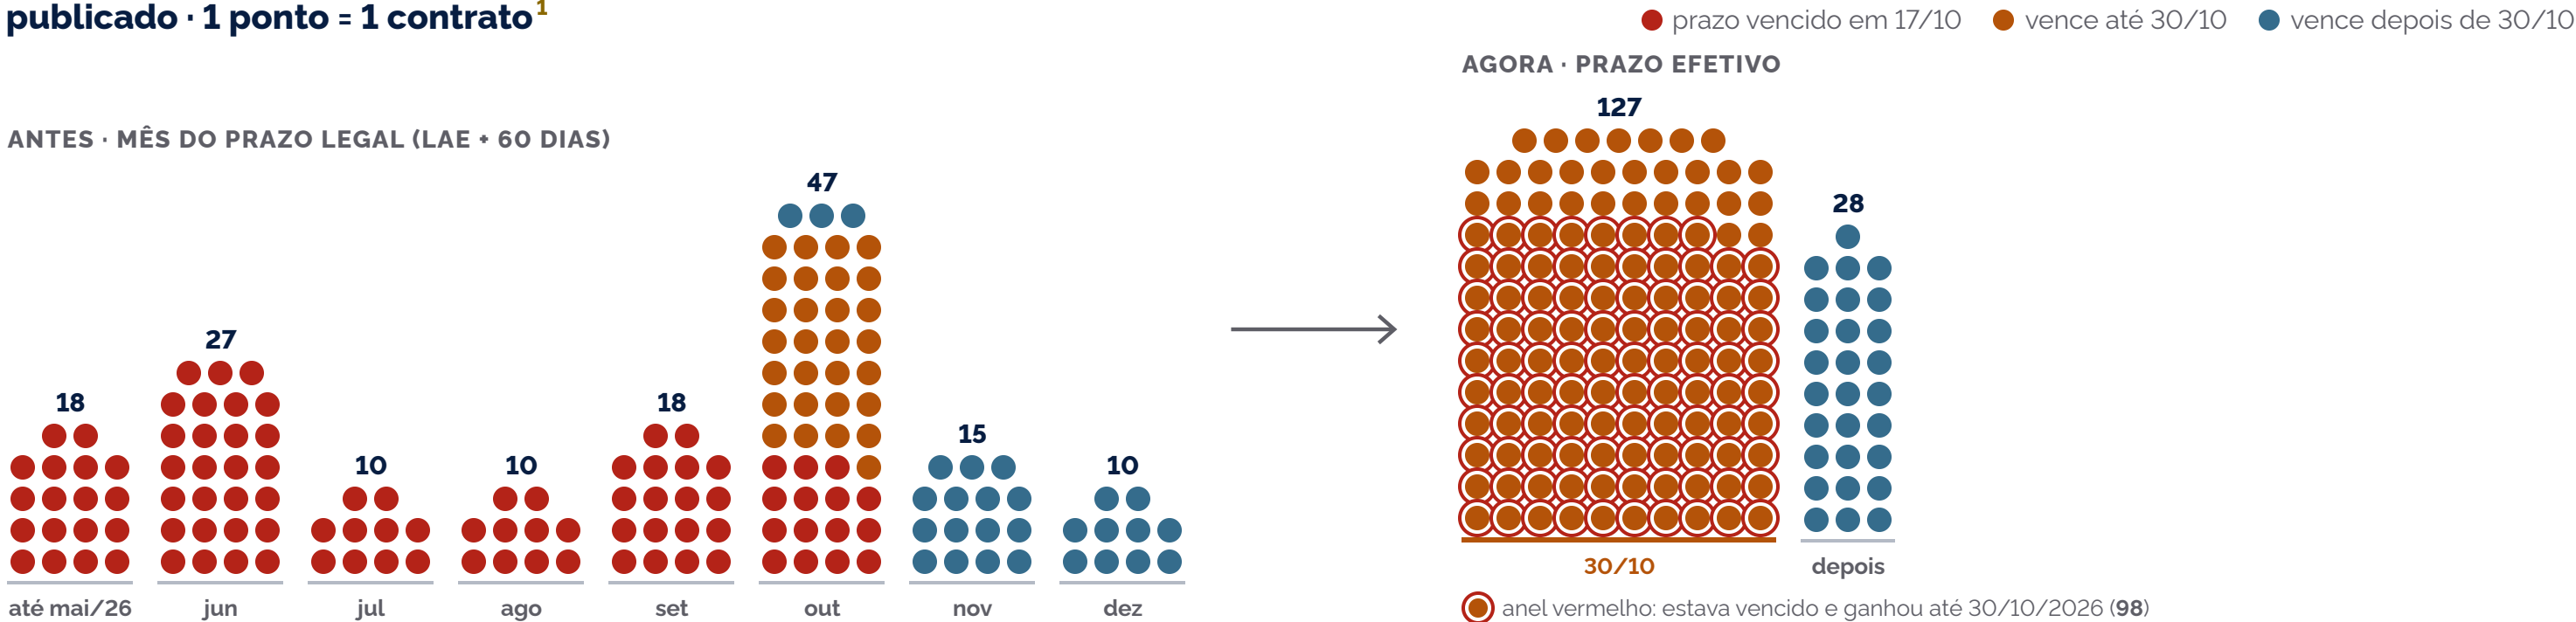

Publicação² · 155 contratos com prazo

Antes	98	29	28
Agora	127		28

Homologação³ · 257 contratos com prazo

Antes	162	19	76
Agora	181		76

¹ Contratos OGU em Contratado - Normal. Prazo efetivo = o maior entre o legal e 30/10/2026, na data da extração. Inclui 59 sem edital e 219 sem homologação assinados antes de 21/10/2025 (PC 72) em simulação: o painelpac não lhes dá prazo; aqui vale a mesma regra. 2 sem LAE ficam fora. Clique num ponto para abrir no SACI. ² conta até a régua (3.2) ⓘ · ³ conta do edital até o fim da licitação (3.2) ⓘ

CONTRATOS PC 72

Incluir (mesma regra)

Fora

4.1
CONTRATAÇÃO

Selecionado × contratado

RECORTE
Brasil — todas as UFs

FONTE
OGU FIN ANO 23 25 26

MEDIDA
Quantidade Valor



Atualizado em 16/10 (GM) e 15/10 (SACI) · Contagem: novas seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	SELEÇÕES²	CONTRATOS ASSINADOS¹	EM CONTRATAÇÃO	CANCELADOS / DISTRATADOS	% ASSINADO	INVESTIMENTO ASSINADO (R\$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	400	303	8	11	75,8%	1.170,65
Abastecimento de Água - Urbano	359	231	25	83	64,3%	5.965,80
Contenção de Encostas	233	177	13	20	76,0%	3.078,62
Drenagem Urbana	439	294	20	69	67,0%	11.593,38
Esgotamento Sanitário	419	182	22	127	43,4%	8.479,72
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	134	82	22	20	61,2%	8.485,69
Regularização Fundiária	309	255	1	9	82,5%	501,81
Renovação de Frota	388	27	18	57	7,0%	2.052,15
Resíduos Sólidos	158	104	20	34	65,8%	739,28
Urbanização de Favelas	115	53	32	30	46,1%	5.104,12
TOTAL	2.954	1.708	181	460	57,8%	47.171,22

¹ ver a conta passo a passo ⓘ · ² Seleções = as 2.954 novas seleções do slide 1.1; as 557 migradas (legado) entram direto na execução (slides 6.1 e 6.2). Sem os 1 contratos com bln_pac = NÃO no SACI e os 19 sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.

4.2CONTRATAÇÃO

Situação dos contratos assinados

RECORTE
Brasil — todas as UFs

FONTE
OGUFINANO232526

1.708
ASSINADOS²

1.328
NORMAL

338
EM SUSPENSIVA³

R\$ 52,8 bi
REPASSE / FINANCIAMENTO

Atualizado em 15/10/2026 · Contagem: contratos assinados do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	NORMAL	SUSPENSIVA ³	CONCLUÍDO	OUTROS ¹	TOTAL ²	QTD. OGU	QTD. FIN	REPASSE / FINANC. (R\$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	172	128	0	3	303	303	0	1.026,25
Abastecimento de Água - Urbano	206	22	2	1	231	183	48	5.737,26
Contenção de Encostas	132	45	0	0	177	172	5	2.972,04
Drenagem Urbana	222	67	0	5	294	267	27	11.219,88
Esgotamento Sanitário	157	19	0	6	182	127	55	7.774,04
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	72	3	5	2	82	64	18	13.683,47
Regularização Fundiária	228	26	0	1	255	255	0	486,85
Renovação de Frota	8	3	14	2	27	0	14	4.500,50
Resíduos Sólidos	83	20	1	0	104	103	1	731,08
Urbanização de Favelas	48	5	0	0	53	39	14	4.664,86
TOTAL	1.328	338	22	20	1.708	1.513	182	52.796,24

¹ Outros: em TCE, liminar e em prestação de contas. ² Os 1.708 assinados são os do slide 4.1. [ver a conta passo a passo ⓘ](#) · ³ [conta das suspensivas \(2.1\) ⓘ](#)

5.1
ORÇAMENTO

Contratado, empenhado, desembolsado e desbloqueado

Quanto do valor contratado no Novo PAC já foi empenhado, desembolsado e desbloqueado, por modalidade.

ORIGEM Migradas Novas RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

MEDIDA R\$ % do contratado EMPENHO ATÉ 2022 Fora Somar

R\$ 37,5 bi

CONTRATADO PÓS-2023¹

R\$ 5,3 bi · 14,2%

EMPENHADO²





R\$ 4,3 bi · 11,4%

DESEMBOLSADO

R\$ 3,7 bi · 10,0%

DESBLOQUEADO³

Atualizado em 15/10/2026 · Valores pós-2023 dos contratos OGU assinados (Novo PAC Seleção + Migrado) · Origem: migradas + novas · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil

Contratado (pós-2023) ▸ Empenhado ▸ Desembolsado ▸ Desbloqueado										mesma escala (R\$) · eixo <u>ajustado</u> / até o contratado — o cinza esmaecido continua além do eixo			
MODALIDADE	0 R\$ mi	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	CONTRATADO (R\$ MI)	EMPENHADO (R\$ MI)	DESEMBOLSADO (R\$ MI)	DESBLOQUEADO (R\$ MI)
Abastecimento de Água - Rural 303 contratos										1.026,25	208,78 20,3%	66,35 6,5%	31,64 3,1%
Abastecimento de Água - Urbano 220 contratos										3.810,61	569,11 14,9%	299,72 7,9%	284,01 7,5%
Contenção de Encostas 210 contratos										3.720,01	456,97 12,3%	348,07 9,4%	291,12 7,8%
Drenagem Urbana 297 contratos										10.350,54	1.006,27 9,7%	578,23 5,6%	440,89 4,3%
Esgotamento Sanitário 223 contratos										4.635,94	1.167,33 25,2%	854,44 18,4%	838,68 18,1%
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades 78 contratos										8.366,02	1.059,75 12,7%	1.408,54 16,8%	1.299,82 15,5%
Regularização Fundiária 255 contratos										486,85	252,82 51,9%	101,48 20,8%	89,03 18,3%
Resíduos Sólidos 102 contratos										721,97	74,61 10,3%	16,11 2,2%	5,81 0,8%
Urbanização de Favelas 112 contratos										4.375,27	542,38 12,4%	606,24 13,9%	465,75 10,6%
TOTAL 1.800 contratos · barra em % do contratado										37.493,45	5.338,02 14,2%	4.279,18 11,4%	3.746,74 10,0%

¹ 1.800 contratos OGU assinados (289 migradas + 1.511 novas), sem em contratação e cancelados; migradas pelo valor GM pós-2023 (o mesmo do 6.2). ² Notas de empenho, OBs e desbloqueios de jan/2023 em diante; empenho das migradas até 2022 não desembolsado (R\$ 1,4 bi): "Somar". ³ OBs liberadas ao contrato, sem contrapartida; nas migradas pode passar do empenho pós-2023.

5.2
ORÇAMENTO

Execução física ×
cobertura de
empenho

ORIGEM

Migradas

Novas

RECORTE

Brasil — todas as UFs

FONTE

OGU

ANO

23

25

26

MODALIDADE

Todas as modalidades

CARTEIRA


Toda

Provável

CONTRATO

TCI, convênio, município

Atualizado em 15/10/2026 · Trimestres: realizado até hoje e projeção pelo ritmo informado · Origem: migradas + novas · Fonte: OGU · Anos: todos · Recorte: Brasil · Modalidade: todas

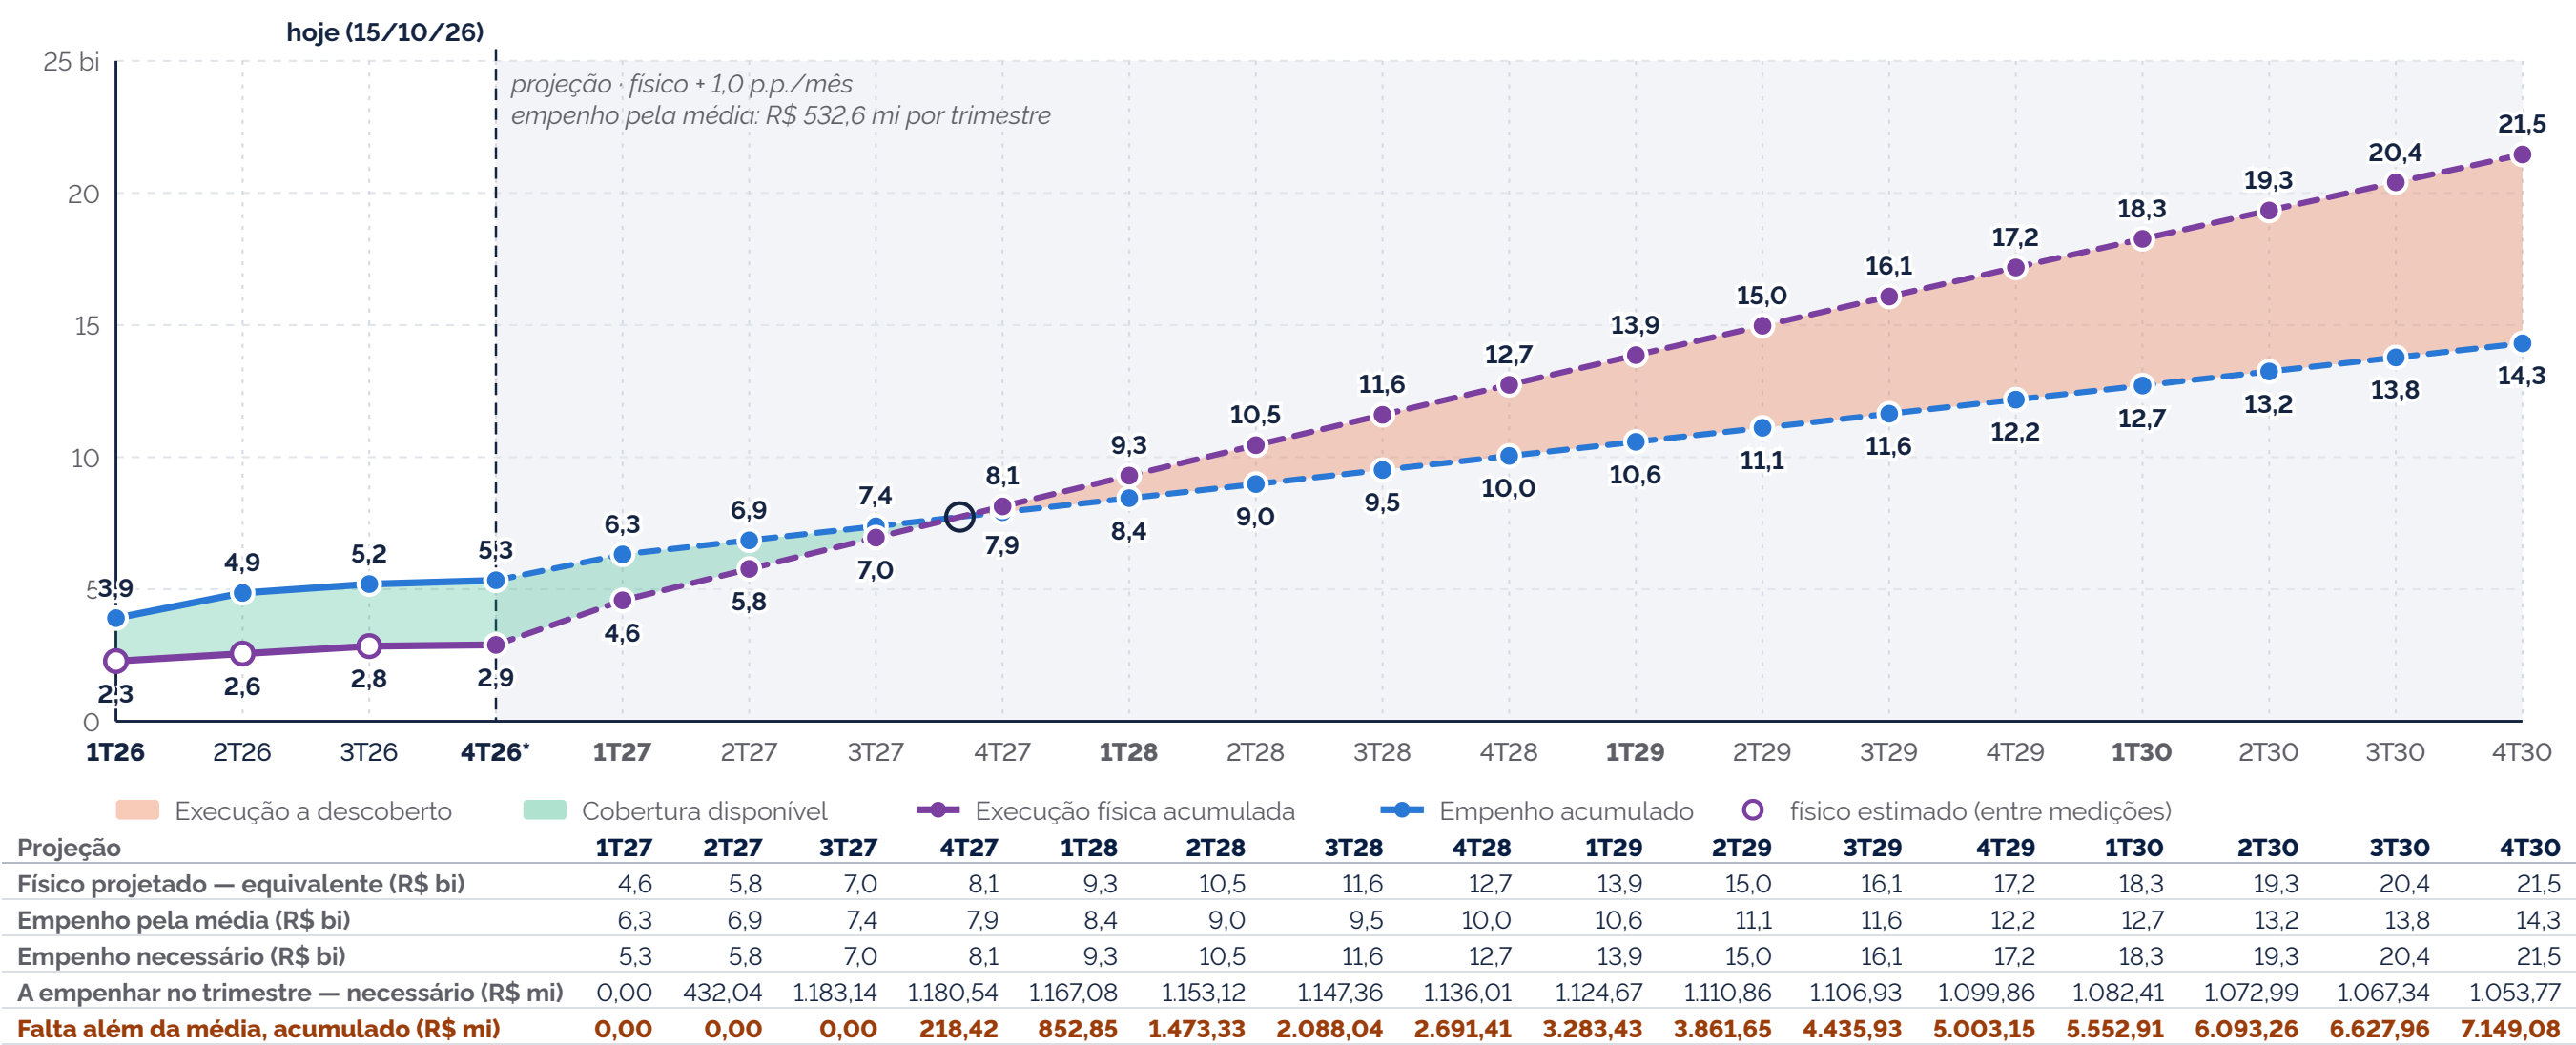

PREMISSAS DA PROJEÇÃO

Ritmo da execução física

1,0

 p.p. ao mês
Medido: 0,5 p.p./mês (dez/25 → hoje)

Realizado desde

1T26

Projeção até

4T30

Não iniciadas e paralisadas entram em

1T27

EMPENHO NA PROJEÇÃO

Média trimestral

Sem novos

Necessário

Média dos últimos

4 trimestres

Média: R\$ 532,6 mi por trimestre (4T25–3T26)

EMPENHO ATÉ 2022

Fora

Somar

EIXO

0–100%

Ajustado

Execução hoje · 7,7%
R\$ 2,9 bi
Necessário até 4T30
R\$ 16,1 bi
43,0% do contratado

Empenho hoje · 14,2%
R\$ 5,3 bi
Maior falta
R\$ 7,1 bi
além da média, em 4T30

¹ Execução física sem cobertura de empenho = % físico acumulado – % empenhado, quando positivo: indicador equivalente, sujeito à metodologia de apuração — não é despesa liquidada nem paga. Hoje: 1.800 contratos, R\$ 37,5 bi contratados e R\$ 5,3 bi empenhados — os mesmos do 5.1 neste recorte. [ver a metodologia](#) ² Carteira, valores e regras: [abrir a página](#)


6.1
EXECUÇÃO

Execução média e paralisações

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

SITUAÇÃO DA OBRA SACI + balanço Só SACI



Atualizado em 15/10/2026 · Médias: obras em execução ou paralisadas (média simples por contrato) · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

MODALIDADE	% FÍSICO MÉDIO			% FINANCEIRO MÉDIO	PARALISADAS	INVESTIMENTO PARALISADO (R\$ MI)	CONCLUÍDAS
	NOVAS SELEÇÕES	MIGRADAS	TOTAL				
Abastecimento de Água - Rural	20,7%	—	20,7%	18,8%	0	0,00	0
Abastecimento de Água - Urbano	20,1%	61,0%	39,6%	41,9%	13	116,73	53
Contenção de Encostas	15,1%	24,3%	19,8%	24,3%	11	133,90	4
Drenagem Urbana	13,1%	55,3%	28,6%	30,0%	7	337,26	14
Esgotamento Sanitário	24,3%	57,6%	48,9%	45,0%	33	513,59	90
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	18,2%	56,7%	31,7%	32,9%	6	403,40	23
Regularização Fundiária	22,1%	—	22,1%	74,5%	1	3,03	0
Renovação de Frota	52,4%	—	52,4%	15,5%	0	0,00	82
Resíduos Sólidos	10,1%	—	10,1%	27,6%	0	0,00	3
Urbanização de Favelas	5,5%	59,9%	43,1%	42,7%	14	101,32	27
TOTAL	24,9%	54,8%	35,9%	42,1%	85	1.609,24	296

¹ Médias simples só das 923 em execução ou paralisadas com % informado: físico 923, financeiro 793 (130 sem informação); não iniciadas, concluídas e inacabadas ficam fora. ² critérios das médias ⓘ

6.2
EXECUÇÃO

Da seleção à obra

Quanto das seleções já virou contrato, obra iniciada e obra concluída.

ORIGEM

Migradas

Novas

RECORTE

Brasil — todas as UFs

STATUS

Selecionadas

Enquadradas

FONTE

OGU

FIN

ANO

23

25

26

MODALIDADE

Todas as modalidades

MEDIDA

Quantidade


Valor

EXIBIR

Total

%

Atualizado em 16/10 (GM) e 15/10 (SACI) · Seleções (GM) × contratos (SACI) · Origem: migradas + novas · Status: selecionadas + enquadradas · Fonte: OGU + FIN · Anos: todos · Recorte: Brasil

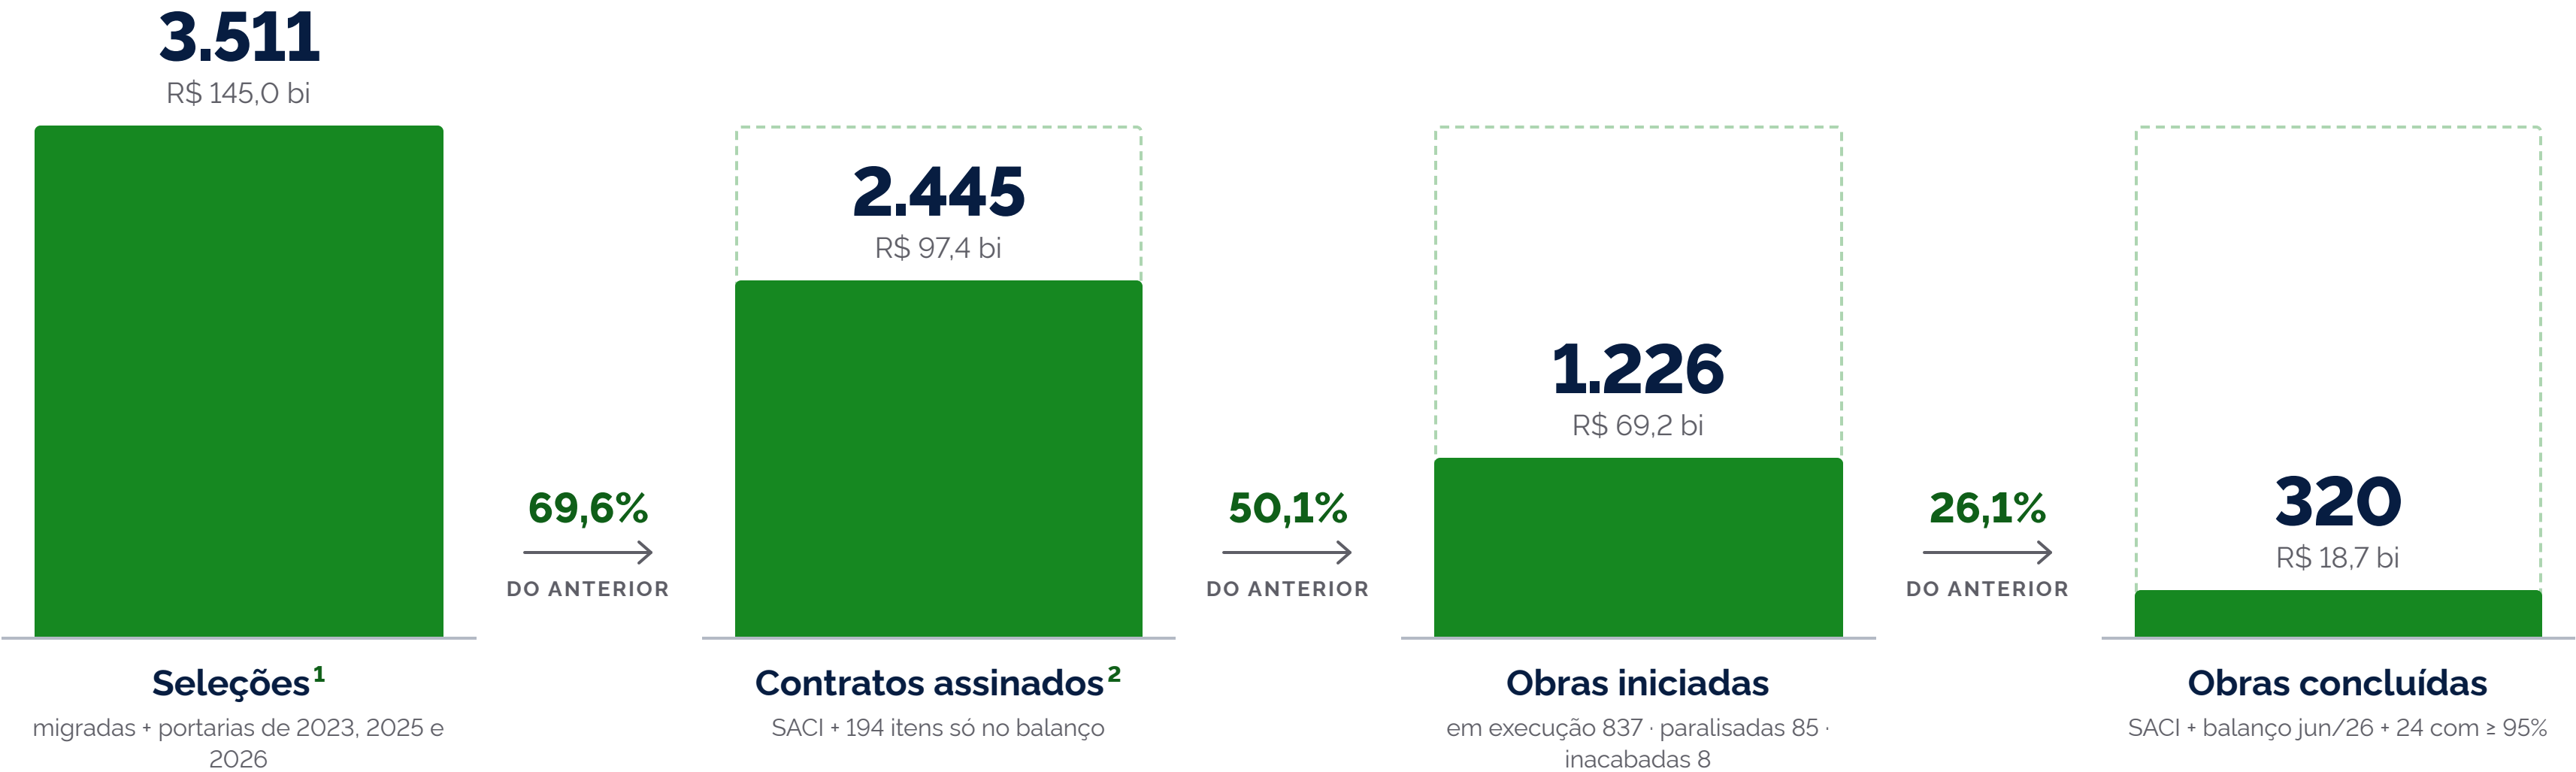

¹ Migradas + novas (migradas saem com recorte de ano). Obra: SACI + balanço jun/26. Concluídas: + iniciadas com ≥ 95% físico. Migradas pelo valor GM (pós-2023). ² Assinados 2.445 = 1.708 do SACI (slide 4.1) + 543 migrados + 194 itens do balanço sem contrato no SACI. conta dos assinados (4.1) ⓘ Valor: portaria nas seleções, repasse nos contratos.

SITUAÇÃO DA OBRA

SACI + balanço

Só SACI

CONCLUÍDAS

+ obras com ≥ 95% físico

Pela situação

Obrigado.

Novo PAC — Ministério das Cidades.

SELEÇÃO

Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 16/10/2026

ORÇAMENTO

SACI — empenhos, desembolsos, desbloqueios e histórico da carteira (dez/22 a dez/25) · 15/10/2026

SITUAÇÃO DAS OBRAS (2ª FONTE)

Balanço Governa — se_cgpac.balancojun2026_com_inativas · referência 30/06/2026

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026

SUSPENSIVAS E LICITAÇÃO

painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 16/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10

EXTRAÇÃO DO BANCO

17/10/2026 às 23:49
