

SECRETARIA-EXECUTIVA · RELATÓRIO

Novo PAC — MCid

Balanço da carteira: evolução e encaminhamentos.

VERSÃO

1.2

DADOS DE

17/10/2026

extração às 23:49 · SACI de 15/10/2026


01	02	03	04	05	06
Seleção	Suspensivas	Licitação	Contratação	Orçamento	Execução
Sumário executivo	02				
Seleção e contratação	03				
Cláusulas suspensivas	04				
Licitação	05				
Evolução dos marcos	06				
Orçamento	07				
Execução e projeção	08				
Encaminhamentos	09				
Notas, fontes e bases	10				

O Novo PAC no MCid em uma página

Retrato Brasil da carteira, da seleção à execução, na extração de 17/10/2026 23:49. Os números são os dos slides no estado padrão (todos os filtros ligados).

SELEÇÃO 3.511 propostas · R\$ 145,0 bi	SUSPENSIVAS 80% retiradas · 294 pendentes	LICITAÇÃO 412 sem edital ou sem homologação · 308 vencem até 30/10
CONTRATAÇÃO 1.708 contratos das novas seleções · 181 em contratação	ORÇAMENTO 14,2% empenhado de R\$ 37,5 bi contratados (OGU)	EXECUÇÃO 838 obras em execução · 85 paralisadas

Da seleção à obra¹

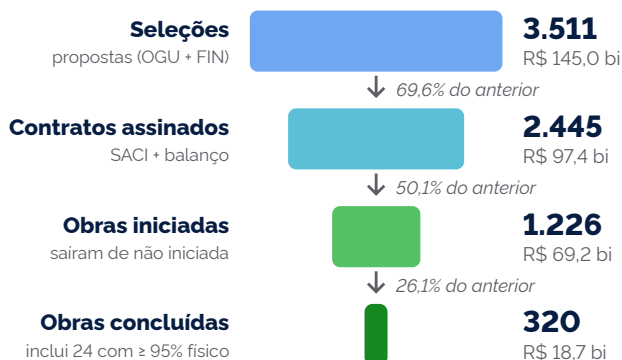

COMO LER · O FUNIL

3.511 seleções → 2.445 contratos → 1.226 obras iniciadas → 320 concluídas. A largura de cada degrau é proporcional à quantidade; a % na seta é a passagem do degrau anterior.

Mensagens-chave

- **Da seleção à obra.** Das 3.511 propostas selecionadas, 2.445 viraram contratos assinados e 1.226 obras começaram (50,1% dos assinados); 320 estão concluídas.
- **Suspensivas.** 1.197 de 1.491 cláusulas já foram retiradas (80,3%). Restam 294 pendentes (R\$ 4,1 bi de repasse), 263 com o prazo da PC 48 vencido.
- **Licitação.** 155 contratos em "Contratado - Normal" ainda sem edital e 257 com edital sem homologação; pelo prazo legal, 260 já teriam vencido; o prazo efetivo deu a eles até 30/10/2026, e 308 vencem nessa janela.
- **Orçamento.** Dos R\$ 37,5 bi contratados após 2023 (OGU), R\$ 5,3 bi estão empenhados (14,2%), R\$ 4,3 bi desembolsados e R\$ 3,7 bi desbloqueados.
- **Projeção.** Na carteira provável, pela média de R\$ 461,7 mi por trimestre, o empenho alcança o contratado em 3T41; a execução física passa do empenho e a maior falta chega a R\$ 11,4 bi em 4T34².

Encaminhamentos de prioridade alta (detalhe na p. 9)

1. **Suspensivas vencidas** — 263 pendentes com o prazo da PC 48 vencido (R\$ 3,9 bi); 32 já sem prorrogação possível → Notificar os entes e decidir, caso a caso, entre retirada imediata, prorrogação (quando cabível) ou distrato.
2. **Editais na janela de 30/10** — 127 contratos sem edital vencem até 30/10/2026 (R\$ 2,6 bi); 98 deles já estavam vencidos pelo prazo legal → Cobrar a publicação do edital até 30/10 com acompanhamento semanal e preparar a notificação de quem não publicar.
3. **Homologações na janela de 30/10** — 181 contratos com edital e sem homologação vencem até 30/10/2026 (R\$ 3,3 bi); 162 já tinham passado de publicação + 120 dias → Levantar a situação de cada licitação (deserta, fracassada, recurso) e cobrar a homologação ou a republicação.

O que andou nos últimos 12 meses³

810 suspensivas retiradas ▲ 434 sobre os 12 meses anteriores	772 editais publicados ▲ 503 sobre os 12 meses anteriores	594 licitações homologadas ▲ 412 sobre os 12 meses anteriores	374 AIOs emitidas ▲ 332 sobre os 12 meses anteriores	371 obras iniciadas ▲ 316 sobre os 12 meses anteriores	R\$ 2,1 bi empenhados (4 trimestres completos) ▲ R\$ 1,0 bi sobre os 4 anteriores
---	--	--	---	---	--

¹ Slide 6.2: seleções da base GM (migradas + novas, OGU e FIN); contratos do SACI sem em contratação e cancelados, mais os itens do balanço sem contrato na carteira; situação da obra pelo SACI + balanço jun/26.

² Premissas padrão do slide 5.2: ritmo de 1,0 p.p./mês, empenho pela média dos 4 últimos trimestres completos, empenho até 2022 fora e início das obras no cenário empírico da PC 48.

³ Contratos OGU do Novo PAC Seleção no painelpac (marcos com data até a extração; detalhe na p. 6) e empenho dos contratos do 5.1 por trimestre completo (p. 7).

Seleção e contratação

Quantas propostas o Novo PAC selecionou no MCid, por modalidade e fonte, e quanto disso já virou contrato (etapas 01 e 04).

PROPOSTAS SELECIONADAS**3.511**

557 migradas + 2.954 novas

VALOR SELECIONADO**R\$ 145,0 bi**

OGU R\$ 41,0 bi · FIN R\$ 104,1 bi

CONTRATOS ASSINADOS**1.708**




das novas seleções · R\$ 47,2 bi de investimento

EM CONTRATAÇÃO**181**

R\$ 22,5 bi · 460 cancelados/distratados

Seleções por modalidade e fonte¹

OGU 2.043 FIN 1.468

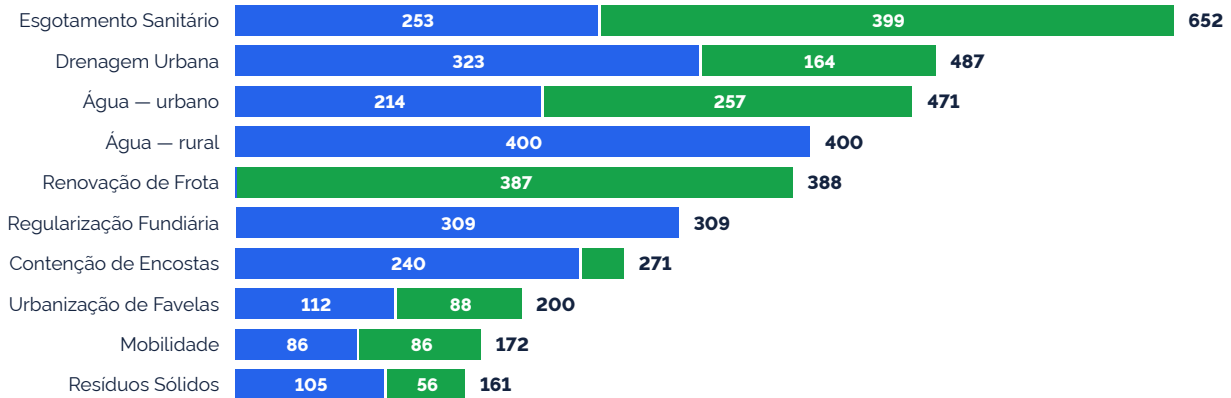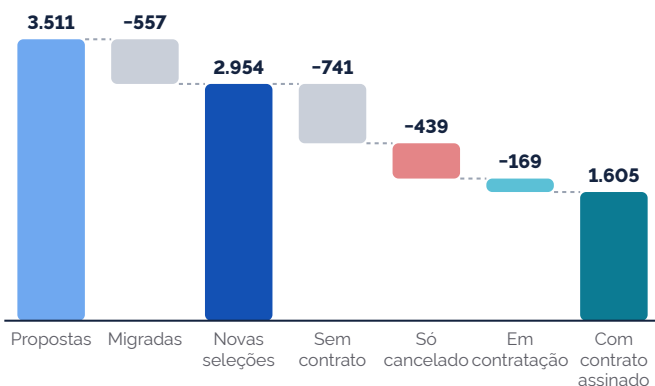**Do selecionado ao contratado²****FIN em contratação, pela fase na Caixa³****Situação dos 1.708 contratos assinados⁴**


OGU 1.513 · FIN 182 · repasse/financiamento R\$ 52,8 bi

COMO LER · A PONTE

2.954 novas - 741 sem contrato + 439 só canceladas + 169 em contratação + **1.605 com contrato assinado** (54,3%).

Evolução: contratos assinados por mês⁵

OGU FIN acumulado



¹ Slide 1.2. Quantidade de propostas (migradas + novas).

² Slide 4.1. A relação proposta x contrato é N:N: cada nova seleção conta pela melhor situação entre os seus contratos (assinado > em contratação > cancelado). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.

³ Planilha "Novo PAC em Contratação" da Caixa (se_cgpc.tab_financiamento_novo_pac), casada pelo número da proposta. As fases acompanham a avaliação nos limites de crédito ao setor público do Bacen (2026).

⁴ Slide 4.2. Outros = em TCE, liminar e em prestação de contas.

⁵ Data de assinatura no SACI dos contratos das novas seleções (o universo do 4.2: sem em contratação, cancelados e os de fora das contas). A linha é o acumulado: 1.680 dos 1.708 contratos têm data de assinatura até a extração.

Cláusulas suspensivas

Quanto das cláusulas suspensivas já saiu, o que segue pendente, os prazos da PC 48 e o alinhamento pactuado pela DMP (etapa 02).

CONTRATOS OGU 1.525 Novo PAC Seleção, sem cancelados	COM SUSPENSIVA 1.491 34 sem cláusula	RETIRADAS 1.197 80,3% das cláusulas	PENDENTES 294 R\$ 4,1 bi de repasse
--	--	---	---


Contratos OGU por situação da suspensiva¹



COMO LER · O % RETIRADO


% retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula = $1.197 \div (1.197 + 294) = 80,3\%$. Os 34 sem suspensiva não entram na conta.

As 294 pendentes pelo prazo da PC 48²




Vencidas: R\$ 3,9 bi · com o prazo prorrogado também vencido: 32 (R\$ 577,9 mi)


Alinhamento da DMP (08/2026)³



Onde estão as pendentes: por modalidade

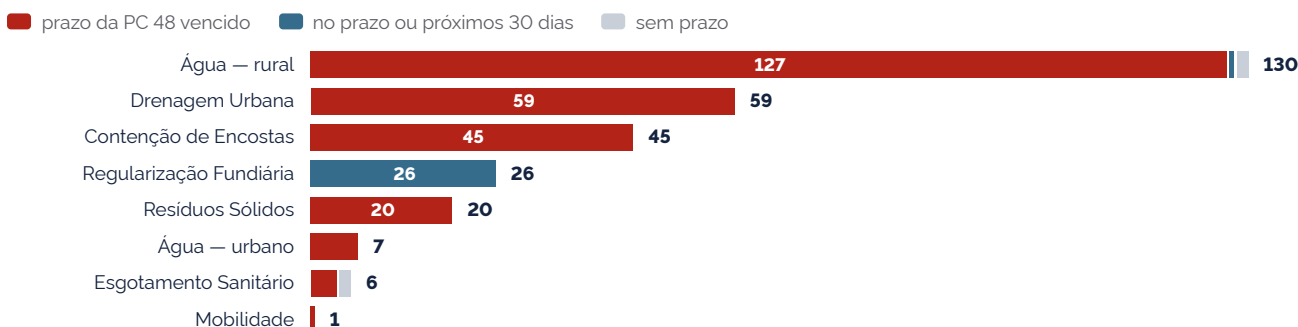

Evolução: retiradas por mês e acumulado⁴



COMO LER · O RITMO

Nos últimos 12 meses saíram 810 cláusulas (67,5 por mês); nos últimos 3, 115. Nesse ritmo, as 294 pendentes levariam cerca de 4 meses.

¹ Slide 2.1. Contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados e sem os de fora das contas.


² Status do prazo da suspensiva pela PC 48/2026 no painelpac (prazo por nível do contrato); "teto vencido" = já passou também o prazo prorrogado.

³ Slide 2.2. Data de retirada pactuada pela DMP em 08/2026 para cada pendente. "Data já passou" = a data alinhada é anterior à extração e a suspensiva segue pendente (divisão feita para este relatório).


⁴ Data de retirada da suspensiva no Transferegov (painelpac). O acumulado (1.197) bate com as retiradas do 2.1.

Licitação

Em que etapa estão os contratos OGU e quantos já passaram do prazo para publicar o edital ou concluir a licitação (etapa 03).



Etapa mais avançada dos 1.525 contratos OGU¹

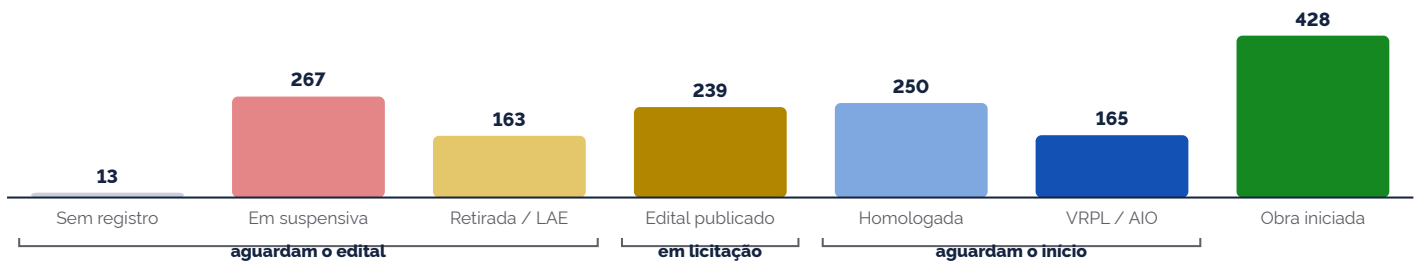


COMO LER · A ESCADA

1.525 = 443 aguardam o edital + 239 em licitação + 415 com licitação concluída + 428 com obra iniciada. Faltam concluir a licitação 682 contratos (44,7%).

Régua do prazo: antes * agora²

■ vencido ■ vence até 30/10/2026 ■ depois de 30/10/2026 · barra clara = antes, escura = agora



COMO LER · SEM EDITAL


155 contratos (R\$ 2,8 bi): pelo prazo legal, 98 estariam vencidos. Com o prazo efetivo, 127 vencem até 30/10 (98 deles resgatados pela janela) e 28 depois; nenhum segue vencido.

COMO LER · SEM HOMOLOGAÇÃO

257 contratos (R\$ 5,0 bi): pelo prazo legal, 162 estariam vencidos. Agora, 181 vencem até 30/10 e 76 depois. Juntas, as duas etapas somam 412 contratos.

Sem edital e sem homologação, por modalidade

■ sem edital ■ edital sem homologação

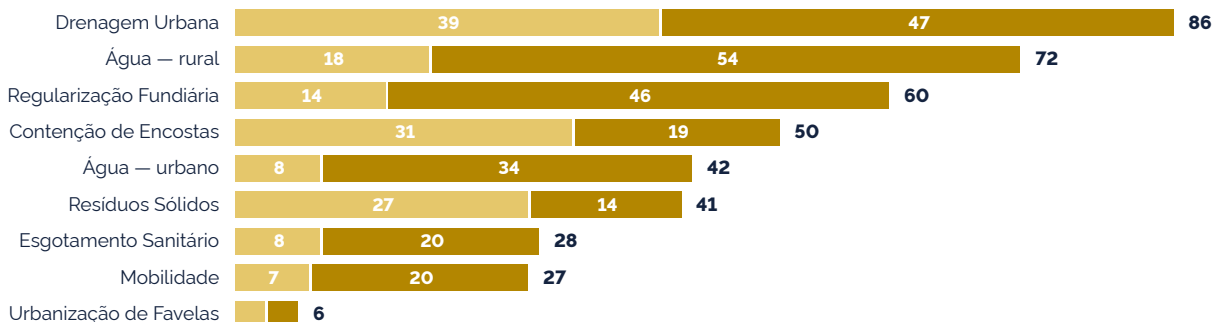


¹ Slide 3.1. Fase atual calculada no painelpac (a etapa mais avançada registrada).

² Slide 3.2. Contratos OGU em "Contratado - Normal". Antes = prazo legal (LAE + 60 dias para o edital; publicação + 120 dias para a homologação). Agora = prazo efetivo do painelpac, que dá até 30/10/2026 a quem já tinha vencido. Contratos da PC 72 (assinados antes de 21/10/2025) seguem a mesma regra.

Evolução dos marcos, de 2024 até hoje

Como a carteira OGU andou mês a mês: da assinatura à retirada da suspensiva, ao edital, à homologação, à AIO e ao início da obra.

Marcos acumulados, mês a mês (contratos OGU)¹

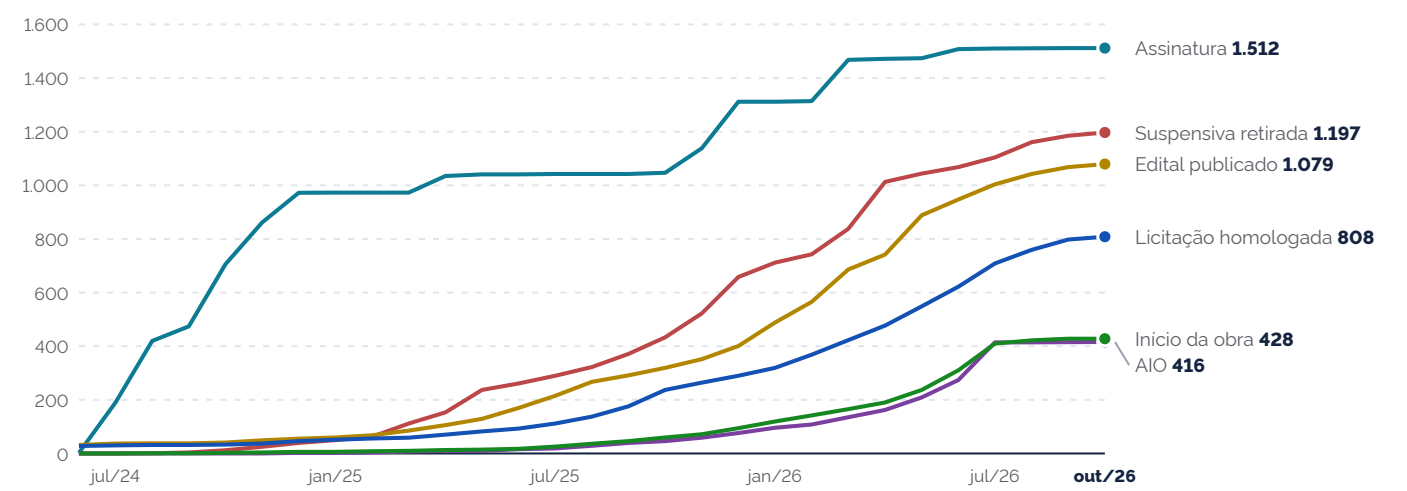

COMO LER · AS CURVAS


Cada curva conta os contratos que já passaram pelo marco até o mês. A distância vertical entre duas curvas é o estoque daquela etapa: hoje, 433 contratos assinados ainda sem edital registrado e 380 homologados sem início da obra. Editais e homologações anteriores a jun/24 (licitação aproveitada) já entram no primeiro mês ².

Ritmo recente de cada marco

MARCO	ATÉ HOJE	ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES	POR MÊS (12 M)	12 MESES ANTES	VARIAÇÃO
Assinatura	1.512	2	470	39,2	476	▼ -6
Suspensiva retirada	1.197	115	810	67,5	376	▲ 434
LAE	1.211	107	823	68,6	376	▲ 447
Edital publicado	1.079	95	772	64,3	269	▲ 503
Licitação homologada	808	129	594	49,5	182	▲ 412
VRPL	590	68	524	43,7	66	▲ 458
AIO	416	2	374	31,2	42	▲ 332
Início da obra	428	18	371	30,9	55	▲ 316

"12 meses antes" - os 12 meses anteriores aos últimos 12; a variação compara os dois períodos ³. A AIO teve 2 registros nos últimos 3 meses, contra 18 inícios de obra: vale conferir se a carga do TDB está atrasada.

Quanto tempo leva cada passo⁴

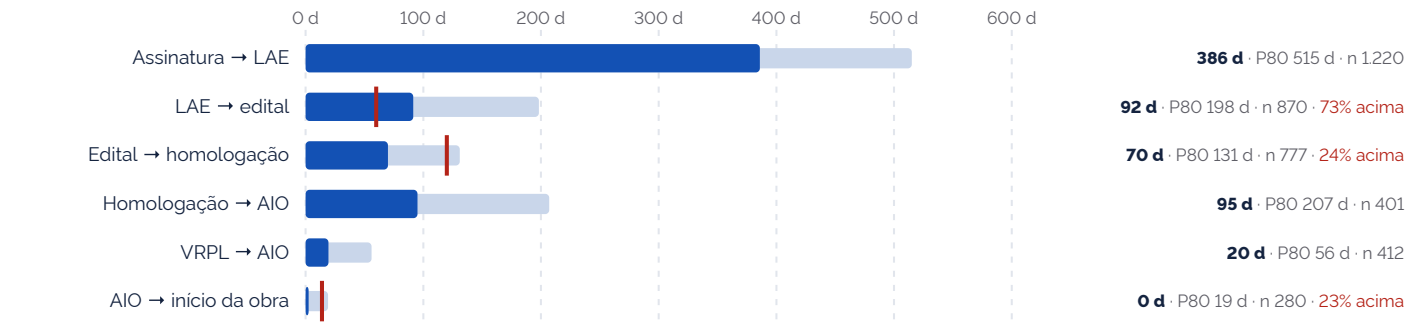

¹ Contratos OGU do Novo PAC Seleção no painelpac (1.525, sem cancelados e sem os de fora das contas). Assinatura e início da obra pelo SACI; retirada, edital e homologação pelo Transferegov; LAE, VRPL e AIO pelo TDB. Datas posteriores à extração ficam de fora.

² Licitações anteriores à assinatura do contrato do Novo PAC: projetos e licitações aproveitados de instrumentos anteriores.

³ LAE e VRPL aparecem só na tabela, para não sobrecarregar o gráfico. A homologação tem datas futuras no Transferegov (14), fora das contas.

⁴ Intervalos em dias corridos entre dois marcos registrados do mesmo contrato (python/inicio_obra.py; saem os negativos e as datas futuras). A barra escura é a mediana (P50); a clara, o P80; o traço vermelho, o prazo da PC 48 (10 dias úteis - 14 dias corridos para a 1ª OS).

Fonte: painelpac (SACI 15/10 · Transferegov 16/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10) · SACI


Extração de 17/10/2026 23:49 · relatório v1.2

Orçamento


Quanto do valor contratado no Novo PAC (só a parte após 2023) já foi empenhado, desembolsado e desbloqueado, e como os fluxos evoluem por trimestre (etapa 05).

CONTRATADO PÓS-2023 R\$ 37,5 bi 1.800 contratos OGU assinados	EMPENHADO R\$ 5,3 bi 14,2% do contratado	DESEMBOLSADO R\$ 4,3 bi 11,4% do contratado	DESBLOQUEADO R\$ 3,7 bi 10,0% do contratado
---	--	---	---

Linha de consumo por modalidade¹

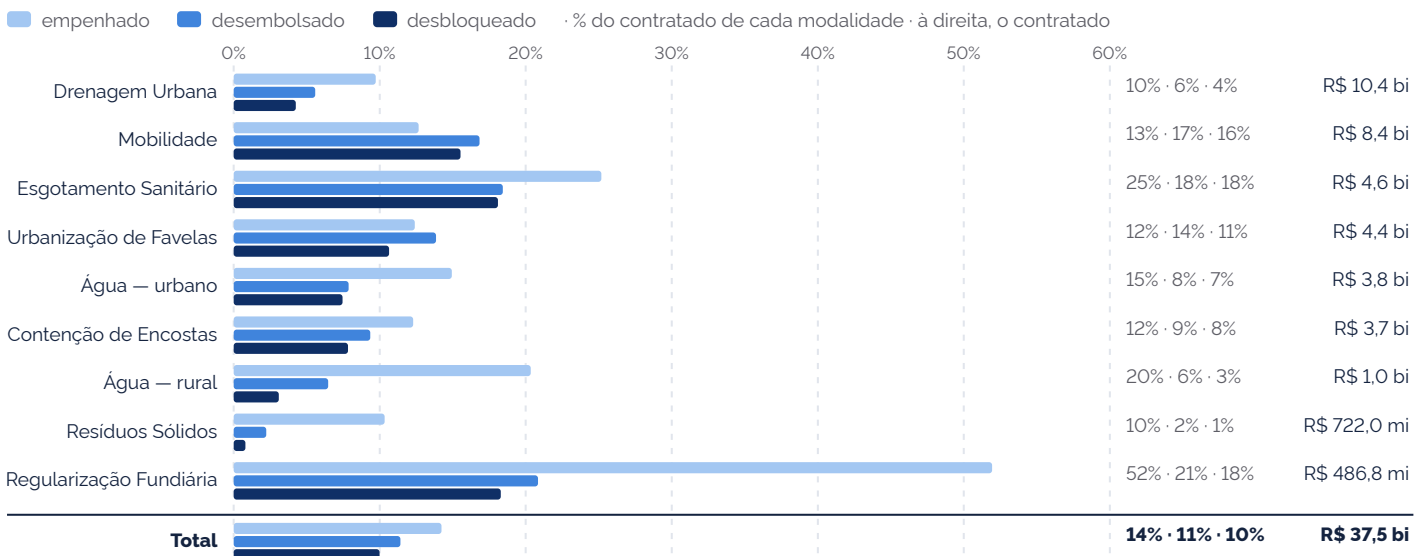

Evolução: fluxos por trimestre desde 2023²

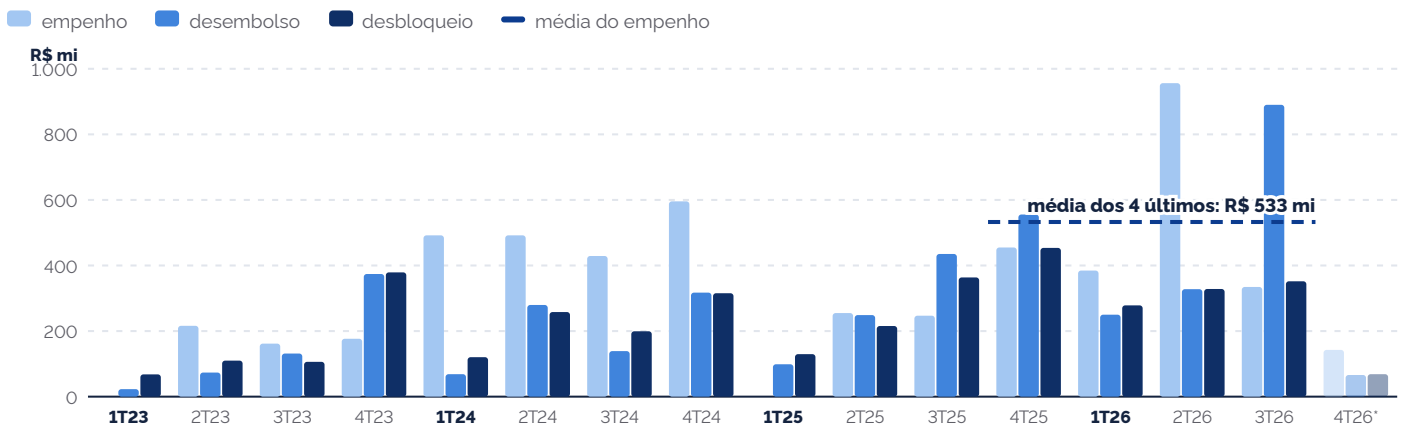

COMO LER · A LINHA DE CONSUMO

De cada R\$ 100 contratados após 2023, R\$ 14 já foram empenhados, R\$ 11 desembolsados e R\$ 10 desbloqueados. Mais empenhada: Regularização Fundiária (52%); menos: Drenagem Urbana (10%). Média dos 4 últimos trimestres completos: R\$ 533 mi empenhados por trimestre, a base da projeção do 5.2 na carteira toda.

Contratado pós-2023

R\$ 37,5 bi

Novas seleções

repasso do SACI

Migradas

valor GM = repasse – desembolsado até 2022

Empenhado

notas de jan./2023 em diante

e, à parte,

Herdado das migradas

R\$ 1,4 bi empenhados até 2022 e não desembolsados — à parte³

¹ Slide 5.1. Contratos OGU assinados do Novo PAC (Seleção + Migrado), sem SNH, em contratação e cancelados. Escala ajustada: de 0 a 60% do contratado.

² Notas de empenho (data de emissão), ordens bancárias (desembolso) e desbloqueios datados de jan./2023 em diante. * trimestre em curso, incompleto.

³ Empenho herdado = empenhado até 2022 – desembolsado até 2022, nas migradas. No slide 5.1 ele pode ser somado pelo botão "Somar".

Execução e projeção


Como estão as obras, quanto a execução física andou frente ao empenho e até quando o empenho no ritmo atual cobre a carteira (etapas 06 e 05.2).

EM EXECUÇÃO 838 obras (SACI + balanço)	PARALISADAS 85 R\$ 1,6 bi de investimento	CONCLUÍDAS 296 1.397 não iniciadas · 8 inacabadas	FÍSICO MÉDIO 35,9% novas 24,9% · migradas 54,8%
--	---	---	---

Situação das obras¹



Evolução: execução física * empenho²

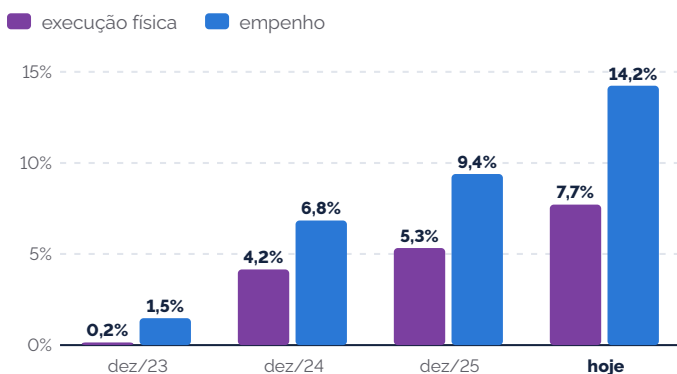


COMO LER · EXECUÇÃO * EMPENHO


Hoje a execução física pós-2023 equivale a 7,7% do contratado (R\$ 2,9 bi) e o empenho a 14,2% (R\$ 5,3 bi): o empenho cobre a execução com folga de 6,5 p.p. Na projeção, a execução passa o empenho em 4T27 (carteira toda) — é aí que começa a falta.

OBRAS EM EXECUÇÃO OU PARALISADAS	NOVAS	MIGRADAS	TOTAL
% físico médio	24,9%	54,8%	35,9%
% financeiro médio			42,1%

Projeção do 5.2, 1T26 a 4T30, em R\$ bi³

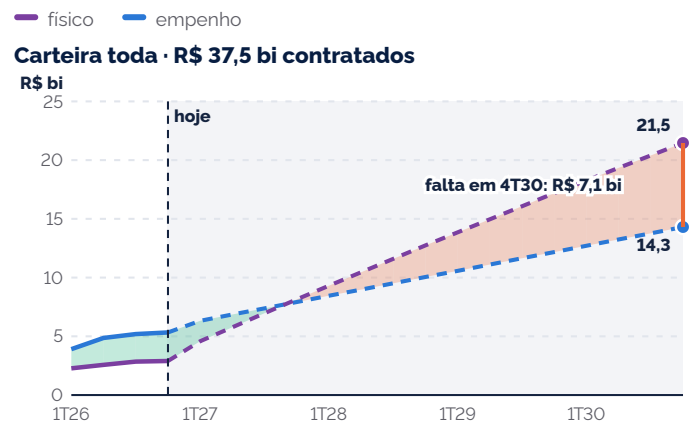


Carteira provável · R\$ 31,9 bi contratados

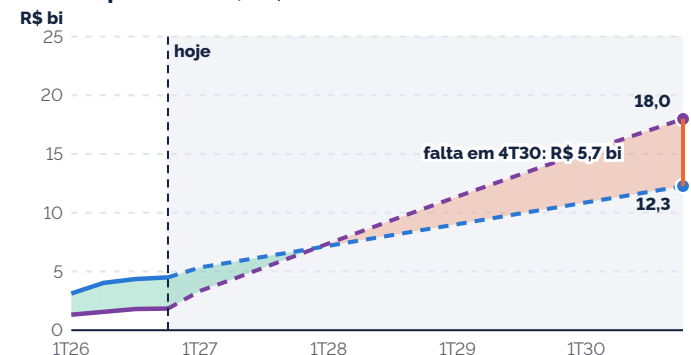

Até esgotar o contratado pela média do empenho: toda em 4T41 (maior falta R\$ 13,9 bi, 1T35); provável em 3T41 (maior falta R\$ 11,4 bi, 4T34).

Quando começam as 783 não iniciadas da carteira provável (PC 48, cenário empírico)⁴

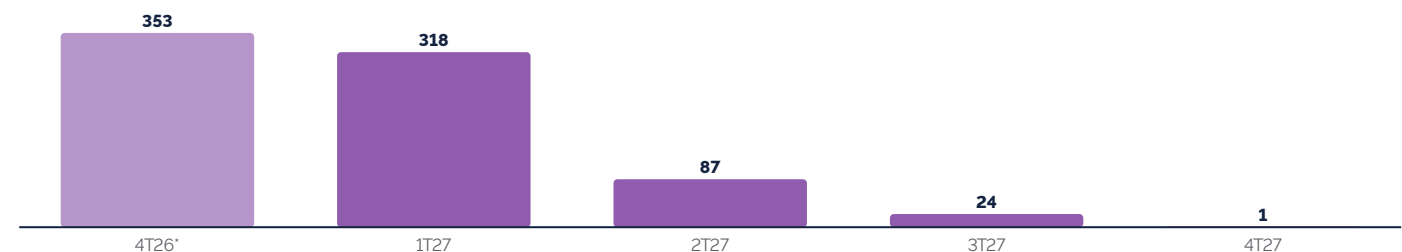

COMO LER · A CARTEIRA PROVÁVEL

Provável = em execução + paralisadas + não iniciadas na régua do 3.2 = 1.417 contratos (R\$ 31,9 bi) de 1.800 (R\$ 37,5 bi). No prazo base da PC 48, 324 das 783 não iniciadas já estão atrasadas (R\$ 5,8 bi). [Ver a página do 5.2](#)

¹ Slides 6.1/6.2. Contratos do Novo PAC Seleção + Migrado (SACI), com o Balanço Governa (jun/26) como 2ª fonte da situação, mais 194 itens do balanço sem contrato na carteira. Físico médio = média simples das obras em execução ou paralisadas.

² Execução física pós-2023 em % do valor contratado (média ponderada; nas migradas, só o que andou desde o menor % registrado) e empenho acumulado de jan/2023 até a data — carteira toda do 5.2.

³ Página 'Carteira e regras do 5.2' (carteira-5-2.html), nas premissas padrão; a janela é a abertura padrão do slide (1T26 a 4T30). Linha cheia = realizado; tracejada = projeção. Verde = empenho cobre a execução; laranja = execução a descoberto.

⁴ Data provável da 1ª OS projetada do último marco registrado com as medianas observadas na base (python/inicio_obra.py). Início já vencido conta de hoje (*).

Encaminhamentos propostos

O que precisa andar para a carteira chegar à obra — com o tamanho de cada pendência e como medir o avanço na próxima extração.

Proposta para validação. Os encaminhamentos abaixo foram tirados dos números deste relatório e ainda precisam ser validados com as áreas responsáveis¹. Cada linha traz o número de hoje e o indicador para acompanhar a saída.

▲ ALTA

 4 ·

● MÉDIA

 4 ·

◆ MONITORAR

 2

#	PRIORIDADE	TEMA	SITUAÇÃO HOJE	ENCAMINHAMENTO PROPOSTO	INDICADOR DE SAÍDA
1	▲ ALTA	Suspensivas vencidas Etapa 02 · slide 2.1	263 pendentes com o prazo da PC 48 vencido (R\$ 3,9 bi); 32 já sem prorrogação possível	Notificar os entes e decidir, caso a caso, entre retirada imediata, prorrogação (quando cabível) ou distrato.	pendentes vencidas na próxima extração
2	▲ ALTA	Editais na janela de 30/10 Etapa 03 · slide 3.2	127 contratos sem edital vencem até 30/10/2026 (R\$ 2,6 bi); 98 deles já estavam vencidos pelo prazo legal	Cobrar a publicação do edital até 30/10 com acompanhamento semanal e preparar a notificação de quem não publicar.	contratos sem edital depois de 30/10
3	▲ ALTA	Homologações na janela de 30/10 Etapa 03 · slide 3.2	181 contratos com edital e sem homologação vencem até 30/10/2026 (R\$ 3,3 bi); 162 já tinham passado de publicação + 120 dias	Levantar a situação de cada licitação (deserta, fracassada, recurso) e cobrar a homologação ou a republicação.	edital sem homologação depois de 30/10
4	▲ ALTA	Cobertura de empenho Etapa 05 · slide 5.2	Na provável, a execução passa do empenho; maior falta R\$ 11,4 bi em 4T34; pela média (R\$ 461,7 mi/tri) o contratado só se esgota em 3T41	Programar o empenho por trimestre a partir da necessidade projetada (não pela média) e levar a falta à LOA e aos limites.	empenho do trimestre ≥ necessário projetado
5	● MÉDIA	Início das obras atrasado Etapa 05.2 · PC 48	324 das 783 não iniciadas da provável já passaram do prazo base da PC 48 (R\$ 5,8 bi); 151 aguardam a AIO	Priorizar VRPL e AIO das homologadas e cobrar a 1ª OS em até 10 dias úteis da AIO.	homologadas sem 1ª OS
6	● MÉDIA	Suspensivas perto do prazo Etapa 02 · slides 2.1/2.2	1 vencem nos próximos 30 dias; 42 com a data alinhada pela DMP já passada e 11 sem data	Reabrir o alinhamento com os entes cuja data pactuada já passou e pactuar data para as que não têm.	pendentes sem data ou com data vencida
7	● MÉDIA	Obras paralisadas Etapa 06 · slide 6.1	85 obras paralisadas (R\$ 1,6 bi), 53 delas migradas	Montar o plano de retomada por obra (causa, responsável, data) e separar as que vão a distrato ou repactuação.	paralisadas e retomadas no período
8	● MÉDIA	FIN em contratação Etapa 04 · slide 4.1	181 contratos em contratação; FIN nas fases inicial/intermediária: 156, sem fase: 5	Acompanhar com a Caixa a fase de cada proposta FIN frente aos limites de crédito do Bacen de 2026.	propostas FIN prontas ou contratadas
9	◆ MONITORAR	Qualidade dos dados Todas as etapas	19 contratos sem modalidade e 1 com bln_pac = NÃO fora das contas; 33 não iniciados no SACI aparecem em obra no balanço	Sanear a modalidade e o bln_pac no SACI e atualizar a situação da obra onde o balanço diverge.	contratos fora das contas e divergências
10	◆ MONITORAR	Acesso às fontes Etapas 03 e 05.2	Marcos da licitação e previsão de início do MCid em views do se_saci sem permissão de leitura	Pedir leitura das views de marcos do se_saci, para trocar a foto do painelpac pela fonte do SACI.	views liberadas

1 A prioridade é fixa por tema: Alta = prazo legal vencido ou falta de recurso; Média = prazo perto de vencer ou obra parada; Monitorar = qualidade de dado e acesso às fontes.
Fonte: todas as bases deste relatório — ver p. 10

Extração de 17/10/2026 23:49 · relatório v1.2

Notas, fontes e bases

Glossário, origem de cada número e os links para a apresentação, a página do 5.2 e as bases desta extração.

Glossário

LAE	Laudo da mandatária que libera a licitação; a 1ª data conta o prazo de 60 dias para o edital.
VRPL	Verificação do Resultado do Processo Licitatório, feita pela mandatária depois da homologação.
AIO	Autorização de Início de Objeto: libera a 1ª ordem de serviço (prazo de 10 dias úteis).
PC 48/2026	Redação da Portaria Conjunta 32/2024 que fixa os prazos da suspensiva e da licitação (art. 36-A), em vigor desde 20/07/2026.
Prazo efetivo	Prazo do painelpac: quem já tinha vencido pelo prazo legal ganhou até 30/10/2026.
Pós-2023	Só a parte do Novo PAC: valores e fluxos de jan/2023 em diante; nas migradas, o valor GM.
Carteira provável	Em execução + paralisadas + não iniciadas na régua do 3.2 (sem edital, sem homologação, homologadas).
Empenho herdado	Nas migradas, empenhado até 2022 e ainda não desembolsado — fica à parte.
Fora das contas	Contratos com bln_pac = NÃO no SACI (1) e sem modalidade (19, exceção provisória).

Fontes e datas

Seleção	Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 16/10/2026
Contratação e execução	SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026
Orçamento	SACI — empenhos, desembolsos, desbloqueios e histórico da carteira · 15/10/2026
Suspensivas e licitação	painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 16/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10
FIN na Caixa	Planilha "Novo PAC em Contratação" (se_cgpac.tab_financiamento_novo_pac)
Situação das obras	Balanço Governa — se_cgpac.balancojun2026_com_inativas · referência 30/06/2026
Extração do banco	17/10/2026 às 23:49

Regras gerais

- Números no estado padrão do deck: Brasil, migradas + novas, OGU + FIN, todos os anos e status.
- Situação das obras pelo SACI com o Balanço Governa como 2ª fonte; concluídas incluem as obras com ≥ 95% físico.
- Marcos da PC 48 (LAE, edital, homologação, VRPL, AIO) pela foto do painelpac: as views de marcos do se_saci estão sem permissão de leitura¹.
- Só agregados: nenhum contrato é listado neste relatório; o detalhe está nas bases protegidas por senha.

Onde cada número está no deck

FOLHA	SLIDES	PERGUNTA
03 Seleção e contratação	1.1 · 1.2 · 4.1 · 4.2	quanto foi selecionado e virou contrato
04 Suspensivas	2.1 · 2.2	quanto já saiu e o que está vencido
05 Licitação	3.1 · 3.2	em que etapa estão e o prazo de cada uma
06 Marcos	—	o ritmo de cada etapa, mês a mês
07 Orçamento	5.1	quanto foi empenhado, desembolsado e desbloqueado
08 Execução	5.2 · 6.1 · 6.2	como andam as obras e a cobertura de empenho

Como atualizar

- Extração** — `./atualizar.sh` tira as fotos do banco (com VPN) e roda o build.
- Build** — `build.py` regera a apresentação, a página do 5.2, este relatório e os dois PDFs com a mesma foto.
- Conferência** — os números deste relatório repetem os do deck no estado padrão; ao mudar uma regra no deck, mudar aqui também (`relatorio.py`).
- Encaminhamentos** — os indicadores de saída da p. 9 mostram, na próxima extração, o que andou.

Bases e documentos

As bases são as fotos do banco desta extração, protegidas por senha.

[APRESENTAÇÃO](#)

[PDF DA APRESENTAÇÃO](#)

[PÁGINA DO 5.2](#)

[PDF DESTE RELATÓRIO](#)

[BASE SELEÇÃO](#) 🔒

[BASE SACI](#) 🔒

[BASE PAINELPAC](#) 🔒

Versões do relatório: **v1.2** Capa com a versão e a data dos dados em destaque. · **v1.1** Projeções do 5.2 de 1T26 a 4T30 (a abertura padrão do slide), com a falta no fim da janela; versão própria do relatório. · **v1.0** Primeira versão: 10 folhas A4 com a evolução de cada etapa, os marcos no tempo, o orçamento, a projeção do 5.2 e os encaminhamentos.

¹ view_aba_execucao", view_ritmo_execucao_", view_mat_dados_transferegov, view_previsao_inicio_fim_mcid e view_mat_fluxo_tc.
